

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Oggetto: PNRR M6C1 1.1. Casa della Comunità di SS Cosma e Damiano: Approvazione modifica contrattuale ex art. 106 co. 2 D.Lgs. 50/2016 e rimodulazione quadro economico

Struttura Proponente:	UOC - Tecnico e patrimonio
Responsabile del procedimento:	Silvio Sicignano
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Cesare Rinaldi

Proposta N° 147 del 05/02/2026

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Attestazione di regolarità economico-contabile

La delibera comporta impegno di spesa: **NO**

Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziaria:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data: **2026-02-05**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Pietro Leone

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data: **2026-02-05**

IL DIRETTORE SANITARIO

Sergio Parrocchia

I seguenti file sono allegati come parte integrante e sostanziale dell'atto:

- Relazione tecnica , Relazione Tecnica di Variante.pdf.p7m
hash256: 06bcc30dfe43e27756f5e847f2bf1f5d6f8c6446aaa0071a00cef14f68b0d2c4
- Perizia di variante , Perizia di Variante n.01.pdf.p7m
hash256: 7ec781845092fc2b05b425186d11d2a037d68645924ba1f7faeb9ea6c1ef0dc7

- Quadro comparativo , Quadro comparativo.PDF.p7m
hash256: 9643b01033d063a825db3af42b51fd49f8b8ac9ad69e7ca812b97c2dcd8ea9e2
- CME , CME var.01.PDF.p7m
hash256: 55b6bbe93a39de95feabfd94f01d4b4b7f71b34ba57aa584dc4dee9c9f81ac3c
- Atto di sottomissione , CDC SS.Cosma e Damiano_Atto di sottomissione_rev.pdf.p7m
hash256: 9c37e09f0da8918aa0dd555309a1619c90ac149f9b703b2a4f15e63914038931
- Relazione del RUP , Relazione ammissibilita' RUP variante CDC SS Cosma e Damiano _signed.pdf
hash256: 1aa1be0509ab88a3c878d3f281f65e992639d3f236e93eb2767fc7055c25ab9f



IL DIRIGENTE TECNICO/RUP

VISTI

- La Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. concernente “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni” e, in particolare, l'articolo 3, comma 1 bis, ai sensi del quale le Aziende Sanitarie devono disciplinare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento con Atto Aziendale di diritto privato nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle disposizioni regionali;
- il Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2014, n. U00259 concernente: “Approvazione dell'Atto di Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”;
- La Deliberazione n. 1 del 15/01/2025 di presa d’atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0003 del 10/01/2025 di nomina della Dott.ssa Sabrina Cenciarelli Direttore Generale della ASL di Latina;
- la Deliberazione del Direttore Generale del 17.03.2025 n. 277, avente ad oggetto “Adozione proposta nuovo atto aziendale”, approvato con DGR n. 175 del 27/03/2025 pubblicato sul BURL n. 26 del 01/04/2025, con cui è stato parzialmente novellato l’Atto Aziendale;
- La Deliberazione n. 382 07/04/2025 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Pietro Leone;
- La Deliberazione n. 383 del 07/04/2025 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore Sanitario al Dott. Sergio Parrocchia;
- la Deliberazione n. 1273 del 19/11/2025 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della U.O.C. Tecnico e Patrimonio afferente al Dipartimento della Committenza e Gestione del Patrimonio, al Dirigente Ingegnere Cesare Rinaldi;
- il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- Il Decreto legge n. 77/2021 s.m.i.;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 389 del 3 luglio 2024 recante ad oggetto “Disposizioni ai sensi del D.lgs 36/2023 e relative deleghe dirigenziali”;
- la Deliberazione n. 1062 del 18 settembre 2025 recante ad oggetto “Ulteriori integrazioni e attribuzioni deleghe dirigenziali”;

PREMESSO CHE:

- previa pubblicazione del bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 21/07/2022, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141-402343 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 85 del 22/07/2022, sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL



D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE 4 TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI;

- la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi quadro multilaterali;
- la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 21 lotti geografici (di seguito, "Lotti Geografici"), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali, tra cui il sub-lotto 4 Lavori in appalto integrato;
- La ASL di Latina si è avvalsa del supporto tecnico operativo della Centrale di Committenza Invitalia aderendo all'Accordo Quadro per l'affidamento delle prestazioni necessarie all'attuazione degli interventi di sua competenza;
- all'esito della Procedura, con provvedimento n. 0326899 del 10/11/2022, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. LAZIO 1, il Sub-lotto Prestazionale 4, cluster AQ1 Lazio 1-9 ricomprensente la progettazione esecutiva e i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Gaeta, Casa della Comunità di Formia, Casa della Comunità di SS Cosma e Damiano, Casa della Comunità di Minturno, Ospedale di Comunità di Gaeta, Ospedale di Comunità di Minturno e Ospedale Sicuro in favore del RTI Imprendo S.r.l – S.A.C.C.I.R. S.P.A.;
- Successivamente sono stati stipulati gli ODA e i Contratti Specifici tra la ASL di Latina e la società Imprendo S.r.l. per ognuno degli interventi sopra riportati appartenenti al Cluster AQ1 Lazio 1-9;
- Con Deliberazione n. 438 del 26/03/2025 la ASL di Latina ha preso atto della costituzione, ai sensi dell'art. 93 D.P.R. 207/2010 da parte del RTI, della LAIT1 S.c.a.r.l., quale società di scopo per l'esecuzione dei lavori previsti nei contratti specifici di appalto integrato PNRR, partecipata dal RTI con le stesse quote del raggruppamento (51% Imprendo S.p.a. e 49% S.A.C.C.I.R. S.P.A.);
- Nell'atto costitutivo del 28/06/2023 a firma del Notaio Dott. Andrea Fontecchia, Rep. 26752, Racc. 21444, registrato in Albano Laziale il 30/06/2023, numero 11012 serie IT, si prevede che la LAIT1 S.c.a.r.l. agisce in nome proprio ma per conto e nell'interesse dei Soci, nell'ambito della promozione e del coordinamento dei loro programmi imprenditoriali aventi ad oggetto la realizzazione di interventi - in via principale - sia diretti che per mezzo di contratti di appalto o di fornitura e, tra gli altri LOTTO 14 – LAZIO 1 CIG: 9326803152;
- la costituzione della suindicata società non estingue automaticamente l'ATI (Cass. Sentenza n.



77/2001, n.13582/01, n.18113/03, n. 11081/04, n. 16410/08, n. 28220/08, n. 21222/11) e pertanto il “subentro” non determina alcuna modificazione nella titolarità dei rapporti con il Soggetto Attuatore Esterno, né dal lato attivo né dal lato passivo e pertanto, tra le altre conseguenze, le domande di subappalto e le comunicazioni di forniture con posa in opera e/o di noli a caldo devono essere presentate dalla capogruppo dell’ATI mentre i relativi contratti sottostanti possono essere stipulati dalla società consortile;

- con Delibera n. 24 del 24/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la Casa Di Comunità di SS Cosma e Damiano;
- con Delibera n. 27 del 24/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la Casa Di Comunità di Formia;
- con Delibera n. 220 del 27/02/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la Casa Di Comunità di Gaeta;
- con Delibera n. 223 del 27/02/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l’Ospedale Di Comunità di Gaeta;
- con Delibera n. 258 del 12/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l’Ospedale Di Comunità di Minturno;
- con Delibera n. 259 del 12/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la Casa Di Comunità di Minturno;

DATO ATTO CHE:

- il Contratto Specifico per la realizzazione della Casa di Comunità di SS Cosma e Damiano concluso in data 29/09/2023, CIG Derivato 9926579820, CUP E88I22000060006, ha un importo lavori di € 588.200,28, al netto del ribasso del 16,30%, oltre € 19.365,9 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;;
- A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico rimodulato l’importo lavori al netto del ribasso del 16,30% è risultato pari ad € 725.284,92 al netto del ribasso del 16,30% di cui € 19.365,90 per oneri della sicurezza;
- In data 09/07/2025 è stato sottoscritto l’addendum n. 1 al contratto Specifico contenente il nuovo importo contrattuale ed il nuovo termine finale dei lavori al 31/12/2025;
- Il cantiere è stato consegnato in data 21/02/2025;


EVIDENZIATO CHE:

- L’area dell’immobile oggetto della realizzazione della Casa di Comunità di SS Cosma e Damiano è stata oggetto di progettazione antincendio;
- Il progetto antincendio è stato predisposto dal tecnico Dott. Ing. Marco Bertocchi, presentato in



data 09/07/2025 (prot. n. 25-U-127), ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, Pratica VVF n. 1435, approvato in data 14/11/2025 con prot. 20881;

- Successivamente l'ing. Bertocchi, fermo restando il progetto già depositato e approvato per l'intera superficie del fabbricato, è stato incaricato di produrre degli elaborati antincendio per la superficie effettiva dell'attività che è inferiore a 1000 mq rendendola assoggettabile alle attività di cui al DPR 151/2011 indicate nella categoria 68.2.A invece di quelle rientranti nella categoria 68.4.B semplificandone l'adeguamento;
- I nuovi elaborati sono stati consegnati in data 29-01-2026 prot. 10918;
- Conseguentemente la modifica progettuale, con nota prot. n. 13136 del 04.02.2026 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia di variante, come descritte nella Relazione allegata, completa degli elaborati di seguito indicati:
 - 1) Relazione tecnica di variante
 - 2) Perizia di variante
 - 3) CME var.01
 - 4) Quadro comparativo
 - 5) Schema di atto di sottomissione
- In particolare, i lavori di adeguamento riguardano:
 - Realizzazione della compartimentazione verticali con pareti EI120 e porte EI30.
 - Realizzazione uscita di emergenza al piano interrato con piazzola di sbarco.
 - Installazione di apparecchi sanitari integrativi
- L'importo della variante è pari ad € 31.307,67 per lavori al netto del ribasso del 16,30%, oltre IVA al 10% (totale ivato € 34.438,44), il tutto pari ad un incremento del 4,34% del addendum n. 1 al contratto;
- Il quadro economico rimodulato dalla variante è il seguente:

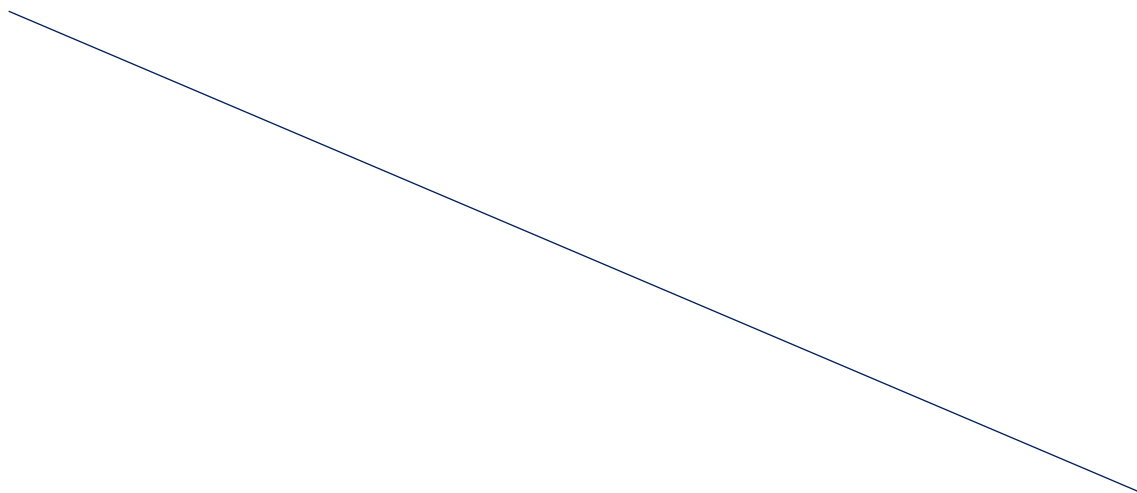



QUADRO ECONOMICO VARIANTE PROGETTO EECUTIVO – CDC SS COSMA E DAMIANO- CUP E8812200060006		QE - VARIANTE	QE-PE	QE – PFTE
A	LAVORI IN APPALTO			
A.1	Importo dei lavori al LORDO del ribasso	€ 880.669,03	€ 843.391,90	€ 702.748,24
	ribasso pari al 36,30% su A.1	€ 143.549,05	€ 137.472,88	/
A.1.1	Importo dei lavori al NETTO del ribasso	€ 737.119,98	€ 705.919,02	/
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 19.365,90	€ 19.365,90	€ 19.365,90
	Importo Totale A.1.1+A2	€ 756.485,88	€ 725.284,92	€ 722.114,14
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Arredi e attrezzature	€ 50.669,05	€ 50.669,05	€ 59.375,00
B.2	Indagini e prove di laboratorio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3	Spese Tecniche			
B.3.a	Progettazione di fattibilità tecnica economica e Attività di supporto al RUP e CSP - IMPORTO NETTO CONTRATTUALIZZATO	€ 28.644,81	€ 28.644,81	€ 87.500,00
B.3.b	Progettazione esecutiva - IMPORTO NETTO CONTRATTUALIZZATO	€ 18.030,79	€ 18.030,79	
B.3.c	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori - IMPORTO STIMATO NETTO	€ 50.537,06	€ 50.537,06	
B.3.d	Collaudo (tecnico-amministrativo,statico, tecnico funzionale degli impianti) - IMPORTO STIMATO LORDO	€ 0,00	€ 1.500,00	
B.3.E	Esperto indipendente	€ 0,00		
	totale B.3.a+B.3.b+B.3.c+B.3.d	€ 97.212,66	€ 98.712,66	€ 92.500,00
B.3.e	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 3.888,51	€ 3.948,51	€ 3.700,00
	TOTALE B.3	€ 101.101,17	€ 102.661,17	€ 96.200,00
B.4	Art.113 d.lgs 50/2016 - 2%	€ 9.056,80	€ 14.505,70	€ 14.442,28
B.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art.24, c.4 d.lgs 50/2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6	Spese per commissioni giudicatrici (IVA Includa)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00
B.7	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 1.367,12	€ 1.367,12	€ 1.367,12
B.8	Spese per allacci	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.9	Imprevisti per lavori	€ 493,48	€ 25.038,33	€ 25.038,33
B.10	Economie derivanti da spese tecniche comprese di Contributo Previdenziale del 4% (IVA ESCLUSA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10.a	Economie di progetto da Pfta	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10.b	Economie derivanti da ribasso sui lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10.c	0,50 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario (Art. 47, c. 1-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34)	€ 717,75	€ 687,36	
B.11	IVA			
B.11.a	IVA su lavori,Imprevisti ed economie di progetto ed economie derivanti da ribasso 10%	€ 75.697,94	€ 75.032,33	€ 74.715,25
B.11.b	IVA su attrezzature e arredi 22%	€ 11.147,19	€ 11.147,19	€ 13.062,50
B.11.c	IVA su indagini e prove di laboratorio 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11.d	IVA su spese tecniche e su economie derivanti da spese tecniche 22%	€ 22.242,26	€ 22.585,46	€ 21.164,00
	TOTALE B.11	€ 109.087,38	€ 108.764,97	€ 108.941,75
	TOTALE B	€ 379.987,24	€ 390.102,70	€ 390.364,89



- Il nuovo importo lavori, incrementato della variante al netto del ribasso è pari a € 756.485,88 inclusi oneri della sicurezza, oltre IVA;

VISTO:

- l'art 106 co. 2 D.Lgs. 50/2016 secondo cui *“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche”*;
- l'art. 106 comma 8 secondo il quale nel caso di modifiche al contratto di cui al comma 2 la stazione appaltante ne dà comunicazione all'ANAC;
- la Deliberazione ANAC n. 582 del 13/12/2023 che ha disposto che *“le comunicazioni obbligatorie all'ANAC riguardanti le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera sono assolve mediante l'invio dei dati tramite Simog o PCP...”*;

DATO ATTO CHE:

- la modifica di che trattasi non altera la natura complessiva del contratto e che il valore della medesima è stato accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche, come risultante dal progetto esecutivo approvato e dall'Addendum n. 1 al Contratto Specifico;
- l'anzidetto incremento del prezzo contrattuale, inoltre, non incide sui requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti in gara;
- per l'esecuzione delle opere previste dalla modifica del contratto è necessario concedere n. 20 giorni aggiuntivi;
- la somma relativa all'aumento dell'importo contrattuale trova copertura nel finanziamento Next Generation EU ad invarianza del finanziamento complessivo;
- in esecuzione del presente provvedimento, è stato sottoscritto atto di sottomissione, ivi allegato, dal Direttore Lavori, dall'Appaltatore e dal RUP;
- ai sensi dell'art. 106 co. 8 D.Lgs. 50/2016 e della Deliberazione ANAC n. 582 del 13/12/2023 la modifica sarà comunicata all'ANAC *“mediante l'invio dei dati tramite Simog o PCP...”*;

ACQUISITA la relazione di ammissibilità del RUP della perizia di variante, agli atti del medesimo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento seppur non materialmente allegata;




ATTESTATA la regolarità giuridico–amministrativa della presente proposta di provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità.

Per tutto quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo e qui integralmente richiamate:

PROPONE

- 1 di prendere atto della relazione del RUP, Ing. Silvio Sicignano, di ammissibilità della perizia di variante del Direttore dei Lavori prot. n. 13136 del 04.02.2026, parte integrante e sostanziale del presente atto, seppur non materialmente allegata, concernente i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di SS Cosma e Damiano;
- 2 di approvare la variante redatta ai sensi dell’art. 106 co. 2 D.Lgs. 50/2016 ed il quadro economico rimodulato post variante come di seguito risultante:

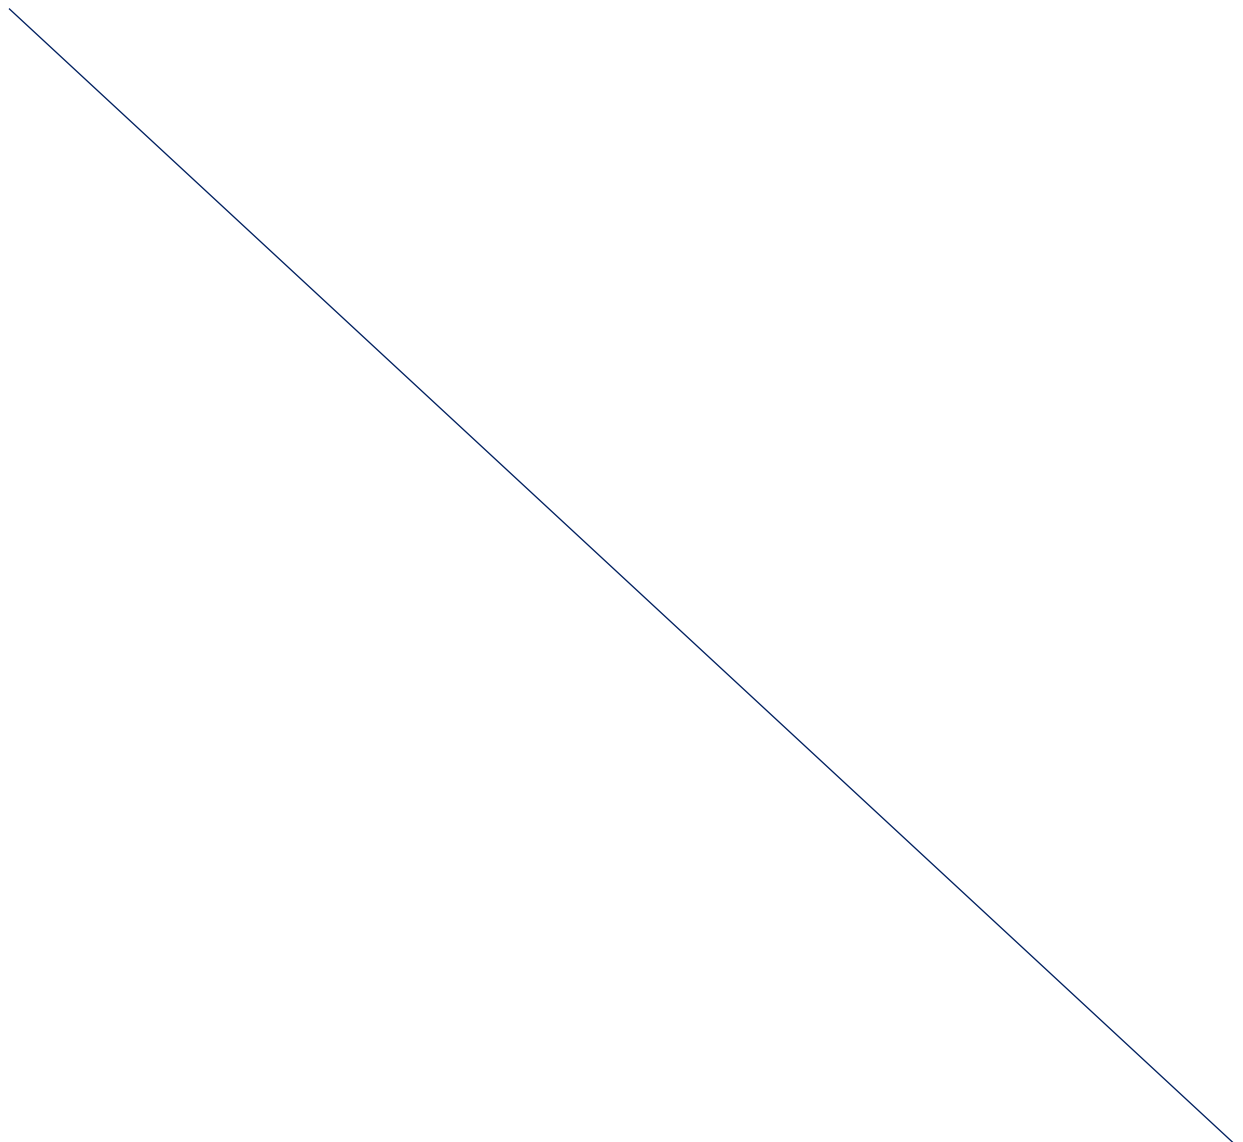



QUADRO ECONOMICO VARIANTE PROGETTO EECUTIVO – CDC SS COSMA E DAMIANO- CUP E88I2200060006		QE - VARIANTE	QE-PE	QE – PFTE
A	LAVORI IN APPALTO			
A.1	Importo dei lavori al LORDO del ribasso	€ 680.669,05	€ 843.391,90	€ 702.748,24
	ribasso pari al 36,30% su A.1	€ 143.549,05	€ 137.472,88	/
A.1.1	Importo dei lavori al NETTO del ribasso	€ 737.119,98	€ 705.919,02	/
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 19.365,90	€ 19.365,90	€ 19.365,90
	Importo Totale A.1.1+A2	€ 756.485,88	€ 725.284,92	€ 722.114,14
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Arredi e attrezzature	€ 50.669,05	€ 50.669,05	€ 59.375,00
B.2	Indagini e prove di laboratorio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3	Spese Tecniche			
B.3.a	Progettazione di fattibilità tecnica economica e Attività di supporto al RUP e CSP - IMPORTO NETTO CONTRATTUALIZZATO	€ 28.644,81	€ 28.644,81	
B.3.b	Progettazione esecutiva - IMPORTO NETTO CONTRATTUALIZZATO	€ 18.030,79	€ 18.030,79	€ 87.500,00
B.3.c	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori - IMPORTO STIMATO NETTO	€ 50.537,06	€ 50.537,06	
B.3.d	Collaudo (tecnico-amministrativo,statico, tecnico funzionale degli impianti) - IMPORTO STIMATO LORDO	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 5.000,00
B.3.E	Esperto indipendente	€ 0,00		
	totale B.3.a+B.3.b+B.3.c+B.3.d	€ 97.212,66	€ 98.712,66	€ 92.500,00
B.3.e	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 3.888,51	€ 3.948,51	€ 3.700,00
	TOTALE B.3	€ 101.101,17	€ 102.661,17	€ 96.200,00
B.4	Art.113 d.lgs 50/2016 - 2%	€ 9.056,80	€ 14.505,70	€ 14.442,28
B.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art.24, c.4 d.lgs 50/2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6	Spese per commissioni giudicatrici (IVA insdusa)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00
B.7	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 1.367,12	€ 1.367,12	€ 1.367,12
B.8	Spese per allacci	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.9	Imprevisti per lavori	€ 493,48	€ 25.038,33	€ 25.038,33
B.10	Economie derivanti da spese tecniche comprese di Contributo Previdenziale del 4% (IVA ESCLUSA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10.a	Economie di progetto da Pfta	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10.b	Economie derivanti da ribasso sui lavori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10.c	0,50 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario (Art. 47, c.3-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34)	€ 717,75	€ 687,36	
B.11	IVA			
B.11.a	IVA su lavori,imprevisti ed economie di progetto ed economie derivanti da ribasso 10%	€ 75.697,94	€ 75.032,33	€ 74.715,25
B.11.b	IVA su attrezzature e arredi 22%	€ 11.147,19	€ 11.147,19	€ 13.062,50
B.11.c	IVA su indagini e prove di laboratorio 22%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11.d	IVA su spese tecniche e su economie derivanti da spese tecniche 22%	€ 22.242,26	€ 22.585,46	€ 21.164,00
	TOTALE B.11	€ 109.087,38	€ 108.764,97	€ 108.941,75
	TOTALE B	€ 272.002,74	€ 282.102,70	€ 280.264,40



- 3 di dare atto che l'importo della variante è di € 31.307,67 per lavori al netto del ribasso del 16,30%, oltre IVA al 10% (totale ivato € 34.438,44), il tutto pari ad un incremento del 4,34% del addendum n. 1 al contratto;
- 4 di dare atto che gli incrementi delle somme di cui ai punti precedenti trovano copertura nel quadro economico ad invarianza del finanziamento complessivo;
- 5 di imputare con successivo provvedimento la spesa di € 34.438,44 IVA inclusa a carico del finanziamento coi fondi Next Generation EU di cui alla DGR 1005/2021, Bilancio 2026;
- 6 di prendere atto dell'atto di sottomissione, parte integrante e sostanziale del presente atto, seppur non materialmente allegato;
- 7 di comunicare il presente provvedimento alla UOC Bilancio e Contabilità;
- 8 di comunicare il presente provvedimento all'ANAC, secondo quanto disposto con Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, Regione Lazio, Direttore dei Lavori e appaltatore;
- 9 di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale Aziendale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento e/o il Dirigente attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Silvio Sicignano

Il Direttore

UOC Tecnico e Patrimonio

Ing. Cesare Rinaldi

LA DIRETTRICE GENERALE

IN VIRTÙ del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00003 del 10 gennaio 2025, di nomina della Dott.ssa Sabrina Cenciarelli quale Direttrice Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina;

ESAMINATA la proposta che precede;

ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale

D E L I B E R A

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra esposte:

- di adottare la proposta in premessa, che qui si intende integralmente riportata.

LA DIRETTRICE GENERALE

Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
